

**ОДОБРЕН**  
президиумом Совета при Главе Республики Тыва  
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам (программам)  
(протокол от 15 марта 2017 г. № 1-пп/17)

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**  
**«Создание современной образовательной среды для школьников в Республике Тыва»**

**1. Основные положения**

Наименование направления	«Образование»		
Краткое наименование проекта	«Современная образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	2016 (с даты утверждения проекта) – 31.12.2020
Куратор	Натсак О. Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Функциональный заказчик	Правительство Республики Тыва		
Руководитель проекта	Санчаа Т. О., министр образования и науки Республики Тыва		
Ключевые участники проекта	Правительство Республики Тыва; Министерство образования и науки Республики Тыва; Министерство строительства жилищного и коммунального хозяйства Республики Тыва; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва; Министерство экономики Республики Тыва; Министерство финансов Республики Тыва.		
Разработчики проекта	Проектный офис Минобрнауки РТ, ГБУ РТ «ХозУ»		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Создание к 2020 году новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва, путем строительства объектов инфраструктуры общего образования; Увеличение к 2020 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.						
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год			
				2017	2018	2019	2020**
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	основной	69,2	70,4	71,6	72,9	74,0
	Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва - всего	основной	825	825	3201	1382	2632
	в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования за счет средств регионального бюджета	основной	825	825	3201	1382	2632
Результаты проекта	К 2020 году 1 - 4 классы и 10 - 11 (12) классы будут переведены на обучение в одну смену; к 2025 году 100 процентов обучающихся будут переведены из зданий школ с износом 50 процентов и выше и обеспечено обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов.						
Описание модели функционирования результатов проекта	Создание новых мест в школах путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения приведет к ликвидации второй смены, обеспечит доступность образования всем категориям населения.						

## 4. Этапы и контрольные точки

		Наименование	
1.	Проект инициирован		01.10.2016
1.1.	Организационно-координационные мероприятия: • координационные рабочие группы по реализации	завершение этапа	31.12.2016

	проекта; • проведены мероприятия по информированию педагогической общественности; • подготовлен сводный план реализации проекта		
2.	Завершение этапа 1	завершение этапа	31.12.2017
2.1.	Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2017 год.	контрольная точка	31.12.2017
3.	Завершение этапа 2	завершение этапа	31.12.2018
3.1.	Обеспечение создания новых мест, в общеобразовательных организациях исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год	контрольная точка	31.12.2019
4.	Завершение этапа 4	завершение этапа	31.12.2020
4.1.	Обеспечение создания новых мест, в образовательных организациях исходя из прогнозируемой потребности на 2019 год	контрольная точка	31.12.2020
5.	Обеспечение создания новых мест, в общеобразовательных организациях исходя из прогнозируемой потребности на 2020 год	контрольная точка	31.12.2021
6.	Проект завершён.	завершение этапа	31.12.2025

### 5. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего 2017-2025
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральные	690098,91	2953908,7	2293627,9	3060153,5	8997789,01
	Субъектов Российской Федерации, местных бюджетов	36321	155468,8	120717,3	161060,71	473567,81
Внебюджетные источники, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>726419,91</b>	<b>3109377,5</b>	<b>2414345,2</b>	<b>3221214,21</b>	<b>9471356,82</b>

### 6. Описание приоритетного проекта

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295          Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2015 года №2145-Р «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя страны» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» от 12 декабря 2014 г. № Пр-2876:          Поручение Президента Российской Федерации от 22 января 2016 г. № Пр-78          Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 2 января 2016 г № Пр-15ГС          Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № Пр-869          Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации Государственной политики в области образования и науки».          Перечень поручений Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.          Перечень поручений Правительства Российской Федерации по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников, 20 августа 2016 г., № ДМ-П8-5082 от 25 августа 2016 г.          Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, утверждённой Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 28 мая 2014 г. № 3241п-П8.          Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.</p>
<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:          1.Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.          Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта</p> <p>Возможности:          1.При реализации проекта может быть использован опыт регионов, негосударственного сектора, зарубежный опыт проектирования и строительства зданий общеобразовательных организаций.          Мероприятия по реализации возможности: развитие сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.</p>

	При строительстве школ используется разработанная и утверждённая Минобрнауки РФ модель «Школы нового типа».
Дополнительная информация	В рамках проекта не осуществляется полное соответствие модели «Школы нового типа».

## ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

### «Создание современной образовательной среды для школьников в Республике Тыва»

#### 1. Обоснование проекта

В республике в настоящее время функционирует 179 общеобразовательных организаций, в которых обучается в общей сложности 61 096 детей. В 2016-2017 учебном году в первый класс пошли 7851 первоклассник, что на 347 человек больше, тенденция роста наблюдается каждый год, в связи с высокой рождаемостью в регионе. Строительство новых школ позволит увеличить число новых мест в общеобразовательных организациях до 2020 года на 7000 новых мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций с базового 69,2 % увеличится до 74, 0%. до 2020 года. Соответственно, создание к 2020 году новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва, путем строительства объектов инфраструктуры общего образования позволит решить проблему с загруженностью школ и приведет к увеличению к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.


#### 2. Методика расчета показателей

Показатель	Тип показателя	Источники данных и алгоритм расчета
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	основной	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р о программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. При расчете целевого показателя (индикатора) "удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического

		<p>наблюдения (форма N 76-РИК).</p> <p>«Удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях» (<math>Y_o</math>) рассчитывается по формуле:</p> $Y_o = \frac{Y - (Y_2 + Y_3)}{Y} \times 100\%,$ <p>где:</p> <p><math>Y_2</math> - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);</p> <p><math>Y_3</math> - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);</p> <p><math>Y</math> - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5).</p>
<p>Число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации - всего</p>	<p>основной</p>	<p>При расчете целевого показателя (индикатора) "число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК, форма С-1).</p> <p>Число новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (<math>Y_{од}</math>) (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:</p> $Y_{од} = (Y_{вп} - Y_{2п} - Y_{3п}) - (Y_{вп-1} - Y_{2п-1} - Y_{3п-1}),$ <p>где:</p>

		<p><math>U_{вп}</math> - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, <a href="#">строка 01</a>, графа 5);</p> <p><math>U_{2п}</math> - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, <a href="#">строка 21</a>, графа 5);</p> <p><math>U_{3п}</math> - численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, <a href="#">строка 22</a>, графа 5);</p> <p><math>U_{вп-1}</math> - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, <a href="#">строка 01</a>, графа 5);</p> <p><math>U_{2п-1}</math> - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, <a href="#">строка 21</a>, графа 5);</p> <p><math>U_{3п-1}</math> - численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, <a href="#">строка 22</a>, графа 5).</p>
--	--	---

### 3. Структурная декомпозиция результатов проекта

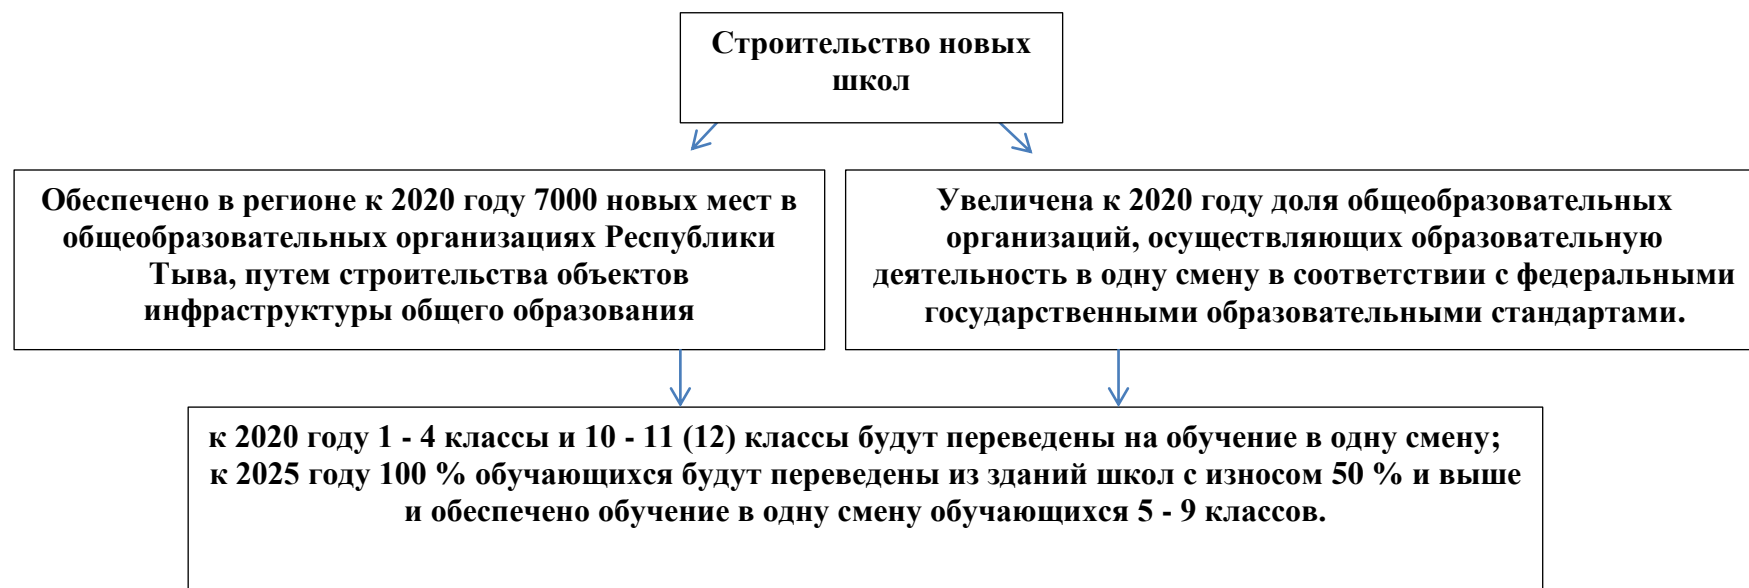

### 4. Календарный план-график работ проекта

	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Проект инициирован	10	30.01.2017	30.01.2017	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	Руководитель проекта: Санчаа Т.О., министр образования и науки Республики Тыва, Фалалеев В.А., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва - министр строительства и



						жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2	Планирование сводного и рабочего планов проекта	7	12.01.2017 г.	30.02.2017 г.	Разработан сводный план реализации приоритетного проекта	Проектный офис
<b>Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва</b>						
1	Завершение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в мкрн. Спутник г. Кызыла Республики Тыва»	261	11.08.2016	01.08.2017	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	Минстрой РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ
1.1	Устройство: -монолитных перекрытий и колонн 3-го этажа блока Б; -монолитных перекрытий 2-го этажа блока А; - монолитных перекрытий и колонн 3-го этажа блока А;	60	1.02.2017 г.	30.03.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.2	Монтаж: -металлических колонн блока Г; -металлических ферм блока Г; -монтаж сэндвич панелей блока Г	85	1.02.2017 г.	27.04.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.3	Устройство перегородок блок А и блок Б	60	1.03.2017 г.	30.04.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.4	Заполнение оконных и дверных проемов	60	1.03.2017 г.	30.04.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.5	Монтаж системы отопления	85	1.02.2017 г.	27.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16	ООО «Суугу» Хунай-оол

	(разводка труб, установка радиаторов и запорной арматуры, теплоузел, узел учета тепла)				от 20.06.2016 г.	А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.6	Монтаж внутренних ГВС,ХВС (разводка труб, установка сан.фаянса и запорной арматуры, водомерный узел)	148	1.03.2017 г.	27.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.7	Монтаж вентиляционных каналов и оборудования	30	1.03.2017 г.	27.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.8	Разводка внутренних эл. сетей	91	1.05.2017 г.	31.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.9	Монтаж розеток и выключателей, светильников	88	1.05.2017 г.	28.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
<b>Кровля</b>						
1.10	Создание разуклонки из керамзита, утепление минплитами	30	1.04.2017 г.	01.05. 2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.11	Устройство мягкой кровли из «Техноэласт»	30	01.05.2017 г.	29.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
<b>Отделочные работы</b>						
1.12	Устройство полов (утепление, армирование, стяжка)	30	13.03.2017 г.	30.04.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.

1.13	Устройство гипсокартонных перегородок	30	1.05.2017 г.	30.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.14	Оштукатуривание вертикальных поверхностей (всех блоков)	30	01.04.2017 г.	30.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.15	Устройство потолков по системе «Армстронг»	30	01.05.2017 г.	30.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.16	Чистовая отделка (укладка керамогранита и виниловой плитки на полы, окрашивание стен)	60	01.05.2017 г.	30.06.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.17	Утепление фасада мин. плитами Монтаж вентилируемого фасада	60	01.04.2017 г.	30.05.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.18	Расстановка оборудования мебели и пусконаладочные работы	30	1.07.2017 г.	30.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
<b>Наружные сети</b>						
1.19	Канализация	89	1.01.2017 г.	31.03.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.20	Водопровод	108	13.03.2017 г.	29.06.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.21	Тепловые сети	42	20.03.2017 г.	17.04.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х.

						ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.22	Электроснабжение	28	1.02.2017 г.	31.03.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
<b>Благоустройство</b>						
1.23	Вертикальная планировка и озеленение территории	91	1.05.2017 г.	30.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.24	Установка МАФов, устройство спортивных площадок	91	1.05.2017 г.	30.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.26	Асфальтирование территории	91	1.05.2017 г.	30.07.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
1.27	Устройство ограждения	30	1.04.2017 г.	30.04.2017 г.	Государственный контракт № 52-16 от 20.06.2016 г.	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
2	Ввод объекта в эксплуатацию	123	01.05.2017	01.09.2017	Распоряжение о передаче в эксплуатационную организацию	Минстрой РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ)
2.1	Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений	58	01.05.2017 г.	29.06.2017 г.	Дополнительный договор по вводу объекта	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
2.2	Получение заключения на соответствие построенного школы проектной	31	01.06.2017 г.	30.07.2017 г.	Дополнительный договор по вводу объекта	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ»

	документации					Илкин В.Е., Салчак А.Д. Служба ГЖИ и строительного надзора Республики Тыва (Ооржак М.Р)
2.3	Получение разрешения на ввод объекта (школа) в эксплуатацию	31	01.07.2017 г.	31.07.2017 г.	Дополнительный договор по вводу объекта	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д. мэрия г. Кызыла(Очур Б.И)
2.4	Оформление кадастровых паспортов на школу	31	01.05.2017 г.	30.07.2017 г.	Дополнительный договор по вводу объекта	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д.
2.5	Государственная регистрация права собственности	31	01.05.2017 г.	31.07.2017 г.	Дополнительный договор по вводу объекта	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д. Управление Росреестра по Республике Тыва
2.6	Передача школы в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности,	31	01.05.2017 г.	31.08.2017 г.	Плана мероприятий (дорожная карта) ввода объекта	ООО «Суугу» Хунай-оол А.В., Монгуш Л.Х. ГКУ РТ «Госстройзаказ» Илкин В.Е., Салчак А.Д. мэрия г. Кызыла(Очур Б.И.), Минземимущество Республики Тыва (Монгуш М.М.)
<b>Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Бай-Хаакская в г. Кызыле Республики Тыва</b>						
1	Заключение договора по пересчету сметных расчетов проекта школы на 825 мест по ул. Бай-Хаакская г. Кызыла на федеральные единые расценки (ФЕР)	30 день	20.01.2017	20.02. 2017 г.	Государственный договор на проектные работы	Минстрой РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ)

2	Подготовка технического задания и документов по выставлению на конкурсные торги	18 день	20.02.2017	10.03.2017	Государственный контракт на строительство	Мингосзакупки РТ
3	(Дополнительно) Подготовка технического задания на подключение к инженерным сетям (Дополнительно) Подготовка технического задания на поставку дополнительного школьного оборудования в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.03.2016 г. № 336	20 день	22.02.2017	15.03.2017	Государственный контракт на строительство	Мингосзакупки РТ
4	Объявление конкурсных торгов (аукцион) на строительство объекта, объявление в течение 20 дня находится на электронной площадке конкурсных торгов (процедура на этапе приема заявок). Прохождение процедуры рассмотрения заявок в течение 3 дней, после чего, в течение 11 дней ведется процедура завершения конкурсных торгов на этапе заключения гос. контракта на строительство объекта.	33 день	16.03.2017 г.	17.04.2017 г.	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минзакупки РТ
5	Заключение государственного контракта с подрядной организацией выигравшей конкурс на строительство объекта.	10 день	18.04.2017г.	27.04.2017г.	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минстрой РТ
6	Оформление документов на строительство объекта: - получение разрешения на	15 день	28.04.2017 г.	14.05.2017 г	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минстрой РТ

	строительство объекта администрации с. Ийи-Тал; - подача заявки в службу ГЖИ и СН Республики Тыва					
7	Выполнение подготовительных работ: - вертикальная планировка участка строительства; - ограждение участка; - устройство временных зданий и сооружений; - получение временного подключения к электроснабжению и водоснабжению.	30 день	15.05.2017 г.	15.06.2017 г.	Государственный контракт на строительство (I этап)	
8	Строительство объекта, в течение срока строительства по условиям заключенного гос. контракта.	199 день	16.06.2017 г.	31.12.2017 г.	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минстрой РТ
<b>Строительство общеобразовательной школы на 176 со спортивным залом и пришкольным интернатом на 50 мест в с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва</b>						
1.	Подача документов в Мингосзакупки РТ для объявления конкурсных торгов (аукциона) на ведение строительства объекта	5 день	1.03.2017 г.	5.03.2017 г.	Государственное задание	Минстрой РТ (ГКУ РТ Госстройзаказ)
2.	Подготовка технического задания и документов по выставлению на конкурсные торги	15 день	5.03.2017 г.	20.03.2017	Государственное задание	Минстрой РТ Минзакупки РТ
3.	Объявление конкурсных торгов (аукцион) на строительство объекта, объявление в течение 20 дня находится на электронной площадке конкурсных торгов (процедура на этапе приема заявок). Прохождение	33 день	20.03.2017 г.	02.04.2017 г.	Государственное задание	Минзакупки РТ

	процедуры рассмотрения заявок в течение 3 дней, после чего, в течение 11 дней ведется процедура завершения конкурсных торгов на этапе заключения гос. контракта на строительство объекта.					
4.	Заключение государственного контракта с подрядной организацией выигравшей конкурс на строительство объекта.	10 день	02.04.2017г.	12.04.2017г.	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минстрой РТ
5	Оформление документов на строительство объекта: - получение разрешения на строительство объекта администрации с. Ийи-Тал; - подача заявки в службу ГЖИ и СН Республики Тыва	15 день	12.04.2017 г.	27.04.2017г	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минстрой РТ
6	Строительство объекта, в течение срока строительства по условиям заключенного гос. контракта.	248 день	28.04.2017 г.	31.12.2017 г.	Государственный контракт на строительство (I этап)	Минстрой РТ
<b>Об утверждении задания на проектирование объектов образования на территории Республики Тыва» (корректировка проекта для повторного применения с привязкой местности)</b>						
1	Согласование проекта постановления по привязке проекта повторного применения на объект: «Общеобразовательные школы на 825 мест в ЛДО по ул. Пригородная и по ул. Ангарский бульвар г. Кызыл Республики Тыва», «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом» в с. Ак-	30	20.01.2017 г.	20.02.2017 г.	Государственное задание	Минобрнауки РТ



	Эрик Тес-Хемского кожууна и с. Кызыл-Хая Республики Тыва в Минюсте РТ					
3	Вынесение проекта постановления на заседание Правительства РТ	14	21.02.2017 г.	28.02.2017 г.	План работы Правительства РТ	Минобрнауки РТ
4	Подготовка технического задания и документов по выставлению на конкурсные торги	15 день	1.03.2017 г.	15.03.2017 г.	Государственное задание	Минстрой РТ
5	Объявление конкурсных торгов (аукцион) на строительство объекта, объявление в течение 20 дня находится на электронной площадке конкурсных торгов (процедура на этапе приема заявок). Прохождение процедуры рассмотрения заявок в течение 3 дней, после чего, в течение 11 дней ведется процедура завершения конкурсных торгов на этапе заключения гос. контракта на строительство объекта.	33 день	16.03.2017 г.	19.04.2017 г.	Государственное задание	Минстрой РТ
6	Заключение государственного контракта с подрядной организацией выигравшей конкурс на проектные работы	10 день	20.04.2017 г.	30.04.2017 г.	Государственный контракт	Минстрой РТ
7	Привязка проекта повторного применения	120	1.05.2017 г.	28.08.2017 г.	Государственный контракт на проектные работы	Минстрой РТ

### 6. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Проект инициирован		30.01.2016	Руководитель проекта	Куратор проекта
1.1.	Организационно-координационные мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• координационные рабочие группы по реализации проекта;</li> <li>• проведены мероприятия по информированию педагогической общественности;</li> <li>• подготовлен сводный план реализации проекта</li> </ul>	завершение этапа	20.02.2016	Руководитель проекта	Куратор проекта
2.	Этап 1. Завершение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в мкрн. Спутник г. Кызыл Республики Тыва	завершение этапа	30.07.2017	Исполнитель проекта	Куратор проекта
2.1.	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в мкрн. Спутник г. Кызыл Республики Тыва	контрольная точка	30.03.2017	Исполнитель проекта	Руководитель проекта
2.2.	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в мкрн. Спутник г. Кызыл Республики Тыва	контрольная точка	01.06.17 г.	Исполнитель проекта	Руководитель проекта
3.	Этапа 3. Подготовка документации строительства общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Бай-Хаакская в г. Кызыле Республики Тыва	контрольная точка	25.12.2017	Руководитель проекта	Проектный офис
3.1	Этап 4. Начало строительства объекта общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Бай-Хаакская в г. Кызыле Республики Тыва	контрольная точка	25.12.17 г.	Руководитель проекта	Куратор проекта
4.	Этап 5. Подготовка документации строительства общеобразовательной школы на 176 со спортивным залом и пришкольным интернатом на 50 мест в с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	контрольная точка	30.03.17 г.	Руководитель проекта	Проектный офис
4.1.	Начало строительства общеобразовательной школы на 176 со спортивным залом и пришкольным интернатом на 50 мест в с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	контрольная точка	25.12.17 г.	Руководитель проекта	Куратор проекта

5.	Обеспечение создания новых мест, в общеобразовательных организациях исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год	контрольная точка	31.12.2019	Исполнитель проекта	Куратор проекта
----	--	-------------------	------------	---------------------	-----------------

### 7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Правительство Республики Тыва	Кара-оол Шолбан Валерьевич, Глава Республики Тыва	Решение социально-значимых вопросов в сфере общего образования
2.	Минобрнауки Республики Тыва	Санчаа Татьяна Оюновна, министр	Решение социально-значимых вопросов в сфере общего образования
3.	Минстрой Республики Тыва	Фалалеев Владимир Александрович, заместитель Председателя Правительства РТ-министр	Наполнение Реестра типовой проектной документации современными эффективными проектами
4.	ГУ МЧС России по РТ	Назаров Андрей Амангельдэвич, начальник	Создание безопасной среды в общеобразовательных организациях
5	Управления Роспотребнадзора по РТ	Салчак Людмила Кимовна	Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях

### 8. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Межведомственная разобщенность	Затягивание сроков реализации проекта,	Оперативный межведомственный контроль	средняя	высокая

		обеспечения результатов проекта в запланированные сроки.			
2.	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации	Замедление реализации проекта, невозможность обеспечения результатов проекта в запланированные сроки.	Оптимизация этапов выполнения проекта. При формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования Минобрнауки России на проект.	низкая	высокая

### 9. Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	Ликвидация ветхого фонда, снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта, обеспечения обучения в односменном режиме	Выполнение этапов проекта. Информационное освещение результатов проекта в СМИ	Высокая	Высокая
2.	Оптимизация нормативно-технической базы, регулирующей строительство и эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций	Улучшение качества строительства при оптимизации затрат. Повышение прозрачности затрат на строительство и эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций	Выполнение этапов проекта	Высокая	Высокая

### 10. Бюджет проекта

Источники финансирования	Год реализации	Всего
--------------------------	----------------	-------

		2017	2018	2019	2020	2017-2025
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральные	690098,91	2953908,7	2293627,9	3060153,5	4977050,0
	Субъектов Российской Федерации, местных бюджетов	36321	155468,8	120717,3	161060,71	261950
Внебюджетные источники, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>		<b>726419,91</b>	<b>3109377,5</b>	<b>2414345,2</b>	<b>3221214,21</b>	<b>5239000,0</b>
